


## 大谷処理場基幹的設備改良工事進捗状況（令和3年2月）

大谷処理場基幹的設備改良工事の令和3年2月の進捗状況を公表します。令和3年2月は、調整槽改良工事及びし尿貯留槽漏水補修工事が完了しました。今後は、性能試験の結果を踏まえ、3月31日に引渡しを受ける予定です。

※令和3年2月末出来高：97.0%

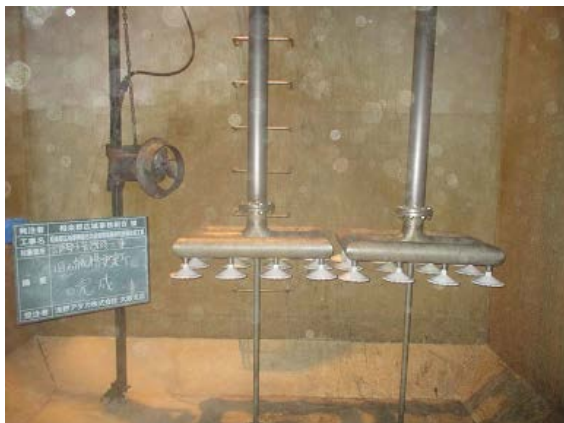

調整槽改良工事①(R3. 2. 16)



調整槽改良工事②(R3. 2. 16)



調整槽改良工事③(R3. 2. 16)



調整槽改良工事④(R3. 2. 16)



し尿貯留槽漏水補修工事①(R3. 2. 18)



し尿貯留槽漏水補修工事②(R3. 2. 18)
